

# 志賀姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No.17



安全は全てに優先する！！

志賀及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV姥ヶ懐トンネル作業所長の西川です。しばらくぶりのお便りとなりました。申し訳ありません。色々と忙しくて・・・は言い訳です。お許しください。で、暑くなって来ました！夏が近づいています。あっという間に田植えも終わりましたね。農家の皆さんは忙しい日が続いている事でしょう。昨年は雨が多かったので、今年はほどほどがいいですね。先日、志賀ではクマの目撃情報もありました。皆様十分ご注意ください。又、そろそろ熱中症も心配になってくる季節です。こちらの方も十分ご注意を。トンネル工事は、残すところあとわずかです。5月17日、村田側の坑門（壁）の打設が完了しました。これをもちまして、トンネル本体のコンクリート打設は全て完了しました。県道からもその様子が見えると思います。なかなか綺麗な仕上がりにと思います。お通りの際は、ちらっと眺めていただければと思います。トンネルの中は、現在舗装工の両脇の排水工事を行っています。6/12で完了です。いよいよ道路本体、路盤工、そして舗装コンクリートと進んでいきます。又、岩沼側の施工ヤードも、大きく様変わりしています。トンネル工事の拠点で色々な設備が集まっていた『仮設ヤード』もその役割を終え、完全撤収が完了しました。後は、土を撤去して、地権者さんに返還するのみです。もうすぐ終わりというながら、まだまだ作業員さんも30~40名の方々が働いています。安全管理にも十分留意し、無事故にて進めていきます。引き続き工事にご理解御協力のほど、よろしくお願い致します。今月も、現在のトンネル坑内の様子などを写真を交えてご紹介したいと思います。

村田側坑口 坑門コンクリート打設前



村田側坑口 インパート最終ブロック施工状況



村田側坑口 スライドセントル外へ



スライドセントルのフォーム



こういうピースが組み合わさっていたんだね。



岩沼側坑口 法面アンカー打設状況



村田側坑口 坑門コンクリート打設状況



トンネルの覆工コンクリートを打設してきた型枠、その役目を終えて、外に出て来ました。お疲れ様です！！



スライドセントル解体状況



トンネル坑内は、道路の両側の排水工事は、完了しました。これから、道路の路盤工、そして舗装工へと進みます。8月末くらいには、道路が出来上がります。




トンネル坑内状況



## 志賀姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況 (H30. 5.31)

トンネル長 L=1285.0m

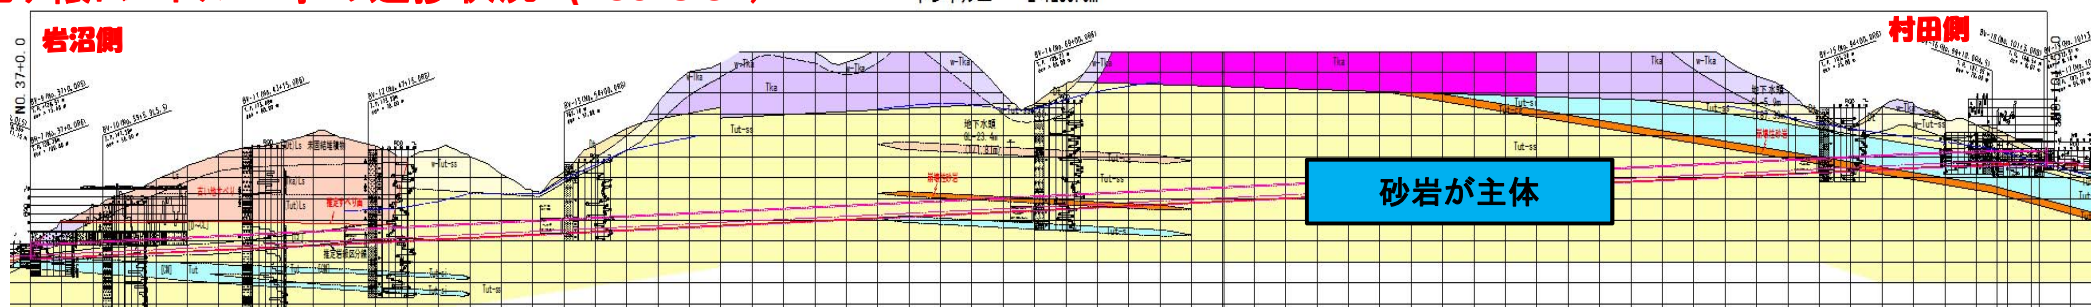

砂岩が主体

実は、トンネルの村田側坑口に、橋ができるんですが、この工事も我々で、引き受ける事になりました！ 7月くらいから着手する予定です。こっちの方も頑張ります！



施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	→ 村田側
掘削工			完了！！
インパート工			完了！！
防水工			完了！！
覆工			完了！！
舗装工	円形水路は、全線完了しました。6/11から、舗装の下の路盤工に着手しています。今月末には、舗装コンクリートがいよいよ始まります！！		

〒989-2465  
宮城県岩沼市志賀新四十刈1  
安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体  
姥ヶ懐トンネル作業所  
TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998  
<http://ubagafutokoro-t.com/>  
フリーダイヤル 0120-034-755  
作業所長 西川 篤哉
