

(仮) 姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV


No.3



ごあいさつ

志賀地区及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JVの西川です。寒くなって来ましたね！インフルエンザも猛威を振るっております。手洗いうがいのみならず、お部屋の湿度を上げる事も効果的です。予防に努めてください。トンネル工事の進捗状況についてご報告致します。現在、掘削は岩沼側坑口から約378m（全長1,285m）の所を掘っています。トンネルの下部（皆様が、車で走る道路の下の部分）にあたるインバートも、現在167m完了。12月に入って、トンネルの入口にあたる『坑門工』にも着手してます。見栄え良く完成するようベストを尽くします。今後とも御協力、どうぞよろしくお願い致します。

トンネル掘削の進め方

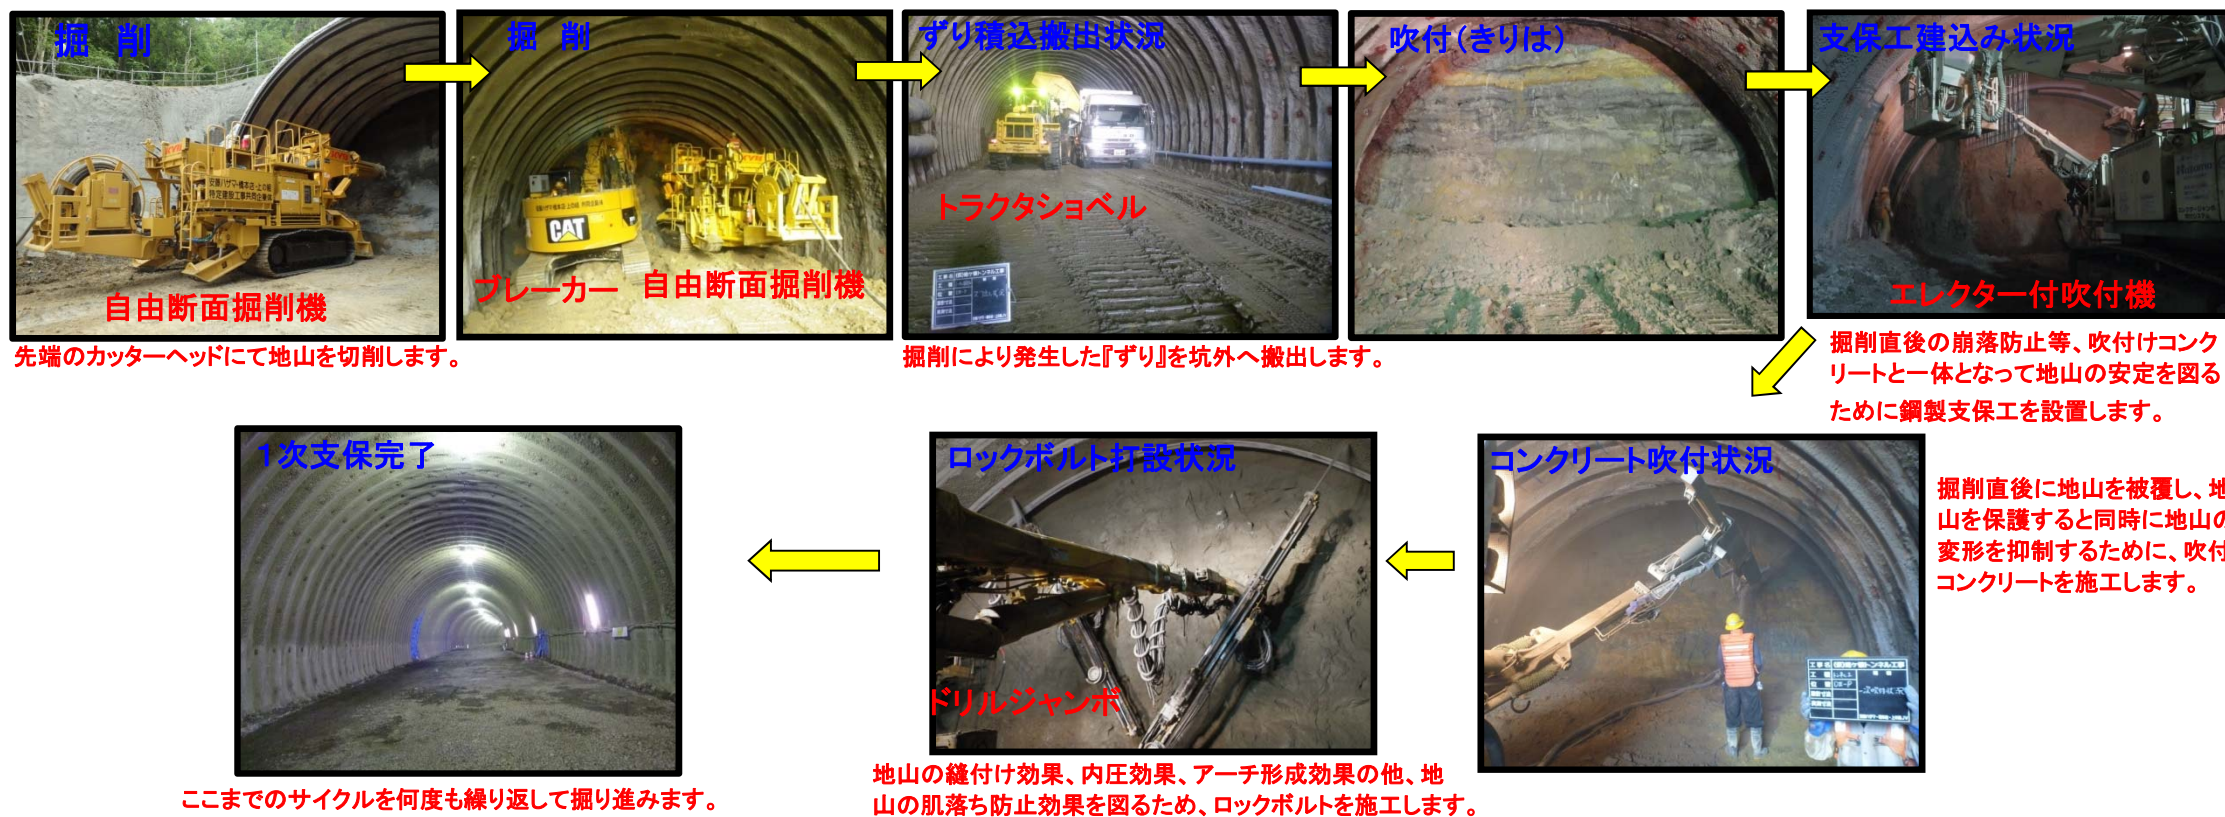


トンネル坑外の現況



起点側(岩沼側)坑口の現況

(仮) 姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況

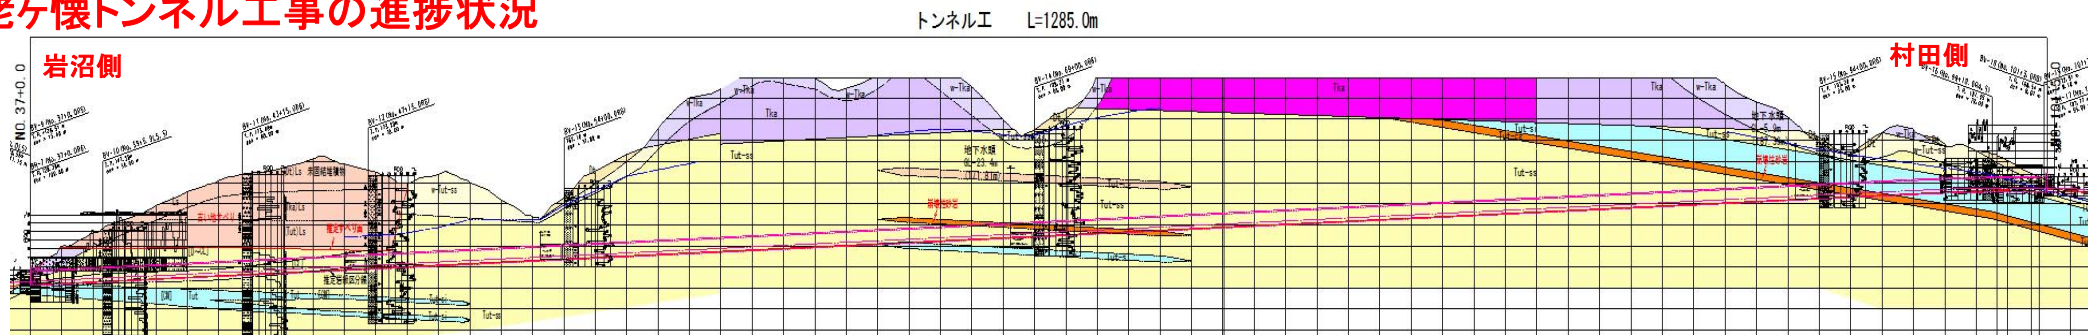

施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	→ 村田側
掘削工	378 m 完了		掘削は、岩沼側から村田に向かって、1日4m程度のペースで掘り進めています。又、インバート工も、1週間に約20mのペースで進めています。
インバート工	167 m 完了		
防水工	40 m 完了		
覆工			
舗装工			

お知らせ

12月1日から、(仮)姥ヶ懐トンネル工事のホームページを立ち上げました。アドレスは以下です。
<http://ubagafutokoro-t.com/>
 工事の進捗状況やTOPICSを掲載していますので、皆様にも見ていただければ、幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

〒989-2465
 宮城県岩沼市志賀新四十刈1
 安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体
 姥ヶ懐トンネル作業所
 TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998
 作業所長 西川 篤哉
