

(仮) 姥ヶ懐トンネル便り


安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No. 4



ごあいさつ
 志賀地区及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV、姥ヶ懐トンネル作業所長の西川です。平成29年が始まりました。今年もどうぞよろしくお願い致します。トンネル工事の進捗状況についてご報告致します。現在、掘削は岩沼側坑口から約450m(全長1,285m)の所を掘っています。トンネルの下部(皆様が、車で走る道路の下の部分)にあたるインバートも、現在230m完了。12月に入って、トンネルの入口にあたる『坑門工』のコンクリート打設も完了し、引き続き、防水工・覆工コンクリートの施工も進めています。地元の皆様に喜んでもらえるような『ものづくり』に誠心誠意取り組んでいきたいと思っております。今後とも御協力、どうぞよろしくお願い致します。先月は、トンネル掘削の進め方を写真にてご紹介させていただきましたが、今回は、トンネルの下部に当たる『インバート工』の流れをご説明致します。当工事では、このインバートの下部に、後で水道管を通すための送水管(直径1.0m)を設置するという、全国的に見ても珍しい工種を含んでおります。


インバート工の流れ

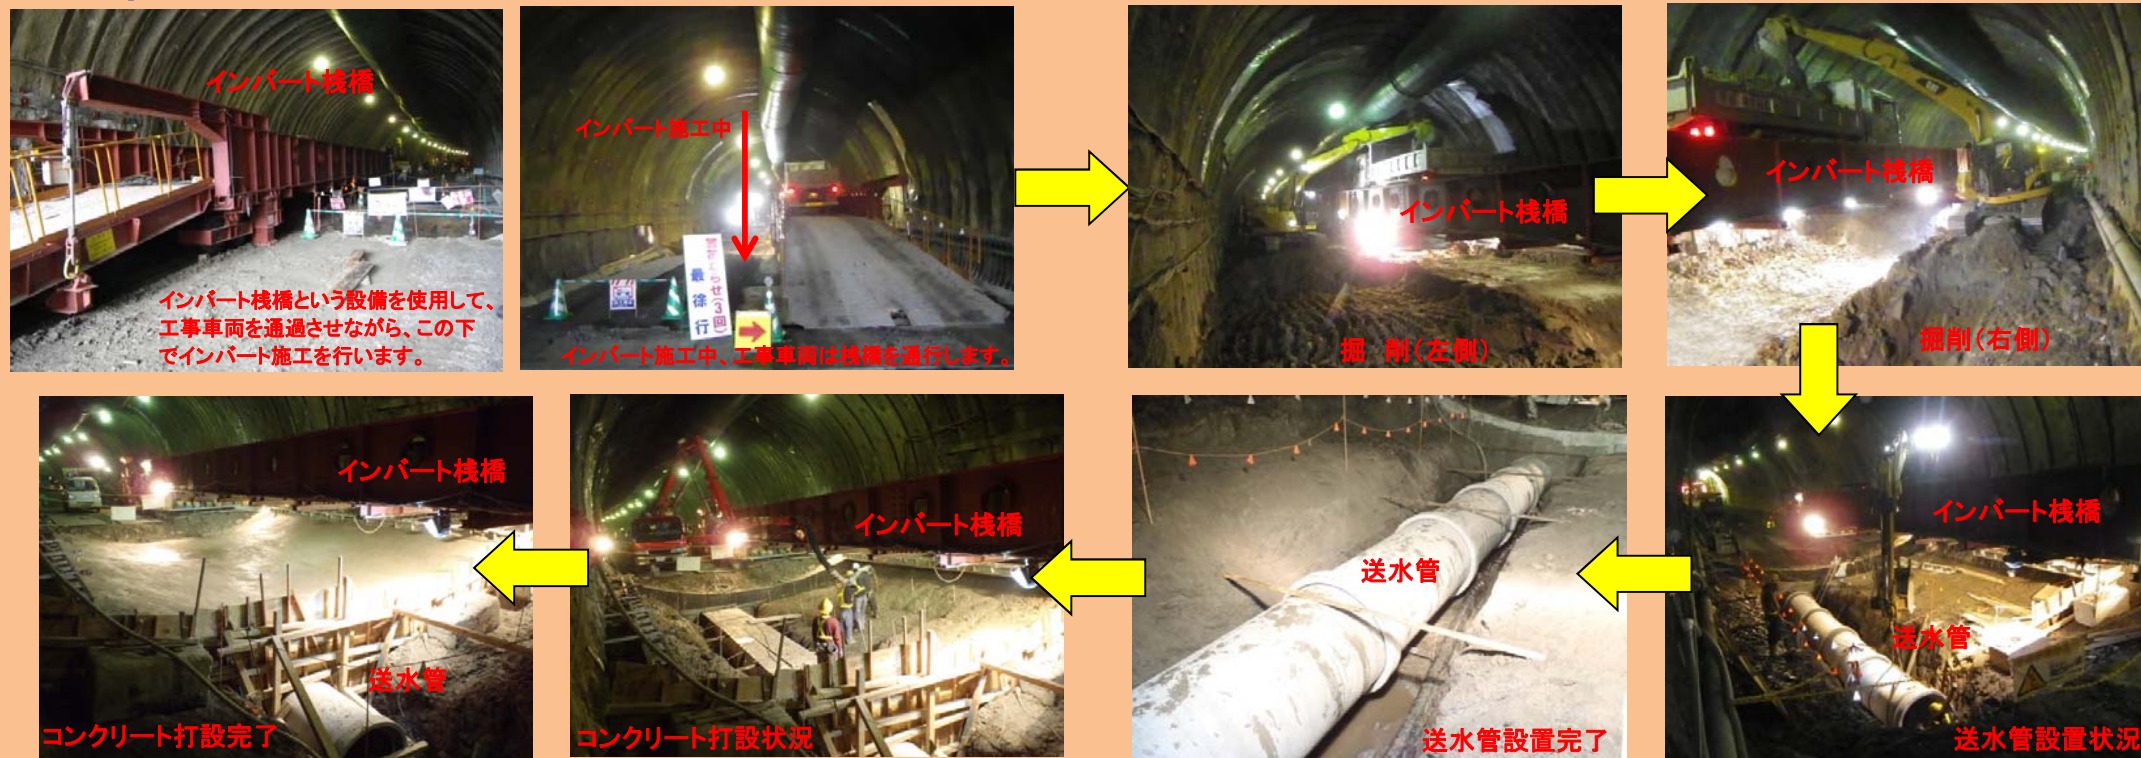

12月、JV事務所前にクリスマスイメージしたイルミネーションを設置しました。好評だったので、引き続き残しておくこととしました。お通りの際は、ご覧いただければ幸いです。



(仮) 姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況

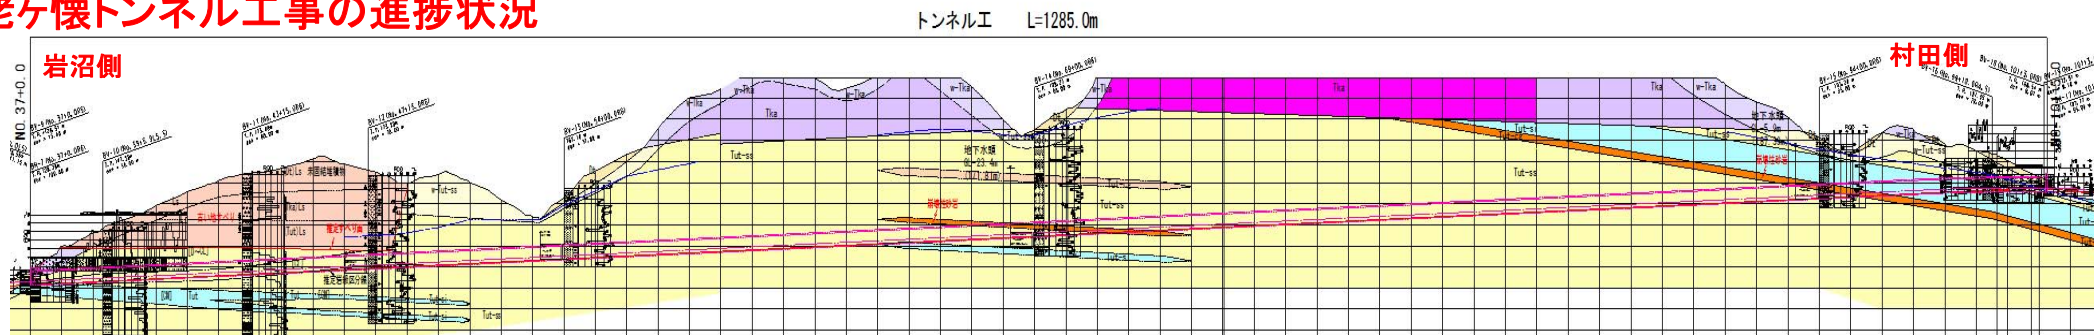

施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	→ 村田側
掘削工	450 m 完了		
インバート工	230 m 完了		
防水工	60 m 完了		
覆工	20 m 完了		
舗装工			

掘削は、岩沼側から村田に向かって、1日に4~5m程度のペースで掘り進めています。又、インバート工も、1週間に約20mのペースで進んでいます。防水工と覆工もスタートしました。

お知らせ
 12月1日から、(仮)姥ヶ懐トンネル工事のホームページを立ち上げました。アドレスは以下です。
<http://ubagafutokoro-t.com/>
 工事の進捗状況やTOPICSを掲載していますので、皆様にもみていただければ、幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

〒989-2465
 宮城県岩沼市志賀新四十刈1
 安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体
 姥ヶ懐トンネル作業所
 TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998
 作業所長 西川 篤哉
