

# (仮) 姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No. 8



**ごあいさつ**  
 志賀地区及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV、姥ヶ懐トンネル作業所所長の西川です。田植えも終わり、緑も濃くなってきて、夏に向かってのを感じます。これから暑くなっていくかと思いますが、熱中症には十分ご注意ください。現在の工事の進捗状況についてご報告させていただきます。現在、『トンネル掘削』は岩沼側坑口から約810m（全長1,285m）。非常駐車帯という拡幅部を2箇所完了しました。トンネルの下部（皆様が、車で走る道路の下の部分）にあたる『インパート工』も、現在618m完了。トンネルの最終仕上がりにあたる『覆工コンクリート工』は、現在470m完了しています。労働災害のないよう最大限の注意を払いながら、日々進めております。今月は、5月27日に実施されました地元の住民の皆様の現場見学会の様子を特集致します。あいにくの雨模様でしたが、総勢60名の皆様にご参加いただきました。常日頃、ダンプの走行でご心配ご迷惑をおかけしているお詫びと工事に御協力いただいている感謝の気持ちを込めて開催させていただきました。トンネルの掘り方を覆工表面に映し出して映像で説明させていただいたり、トンネル機械が実際に動くのを見ていただいたり、我々も有意義な時間を過ごすことができました。これを機に、更にトンネル工事へのご理解をいただけます事を心よりお願い申し上げます。我々も皆様方のご期待に添えるようベストを尽くします！



6/3 早朝から、岩沼市のクリーン作戦に参加致しました。黄色のジャンパーを着ているのが、我々トンネル職員です。終了後、住民の皆さんと記念写真を撮影させていただきました。秋にも予定されているとのこと。必ず参加します。思ったよりもゴミが少なく、綺麗な街だなあ、住民の皆さんも意識が高いなあと感じました。

## 現場見学会について 平成29年 5月27日 10:00 ~ 11:30

完成したトンネルの壁面にトンネルの作り方など映像を映し出して説明いたしました。

トンネルの最前線の切羽で記念写真(後ろにある機械はドリルジャンボです。)

可愛いお客さんも、トラクタショベルの前で記念撮影

雨の中、来てくれてありがとうございました！！

お越しいただいた皆様にご挨拶 BY 西川

覆工コンクリートを打設するスライドセメントルを見ていただきました。


アン姉さん ハザ丸



切羽(起点坑口から800m)

## (仮) 姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況 (H29.5.31)

トンネル工 L=1285.0m

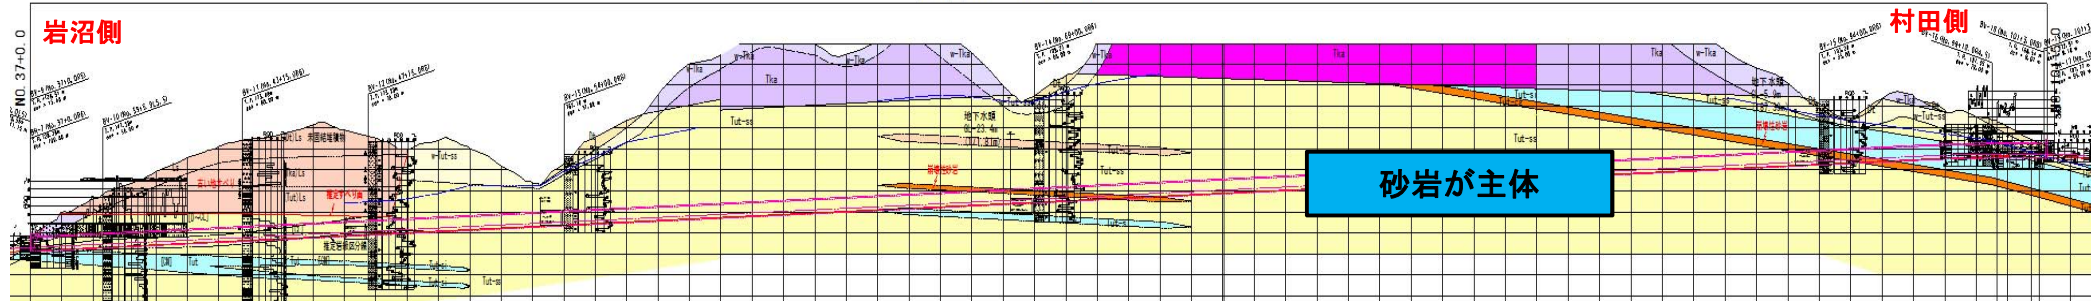

**お知らせ**  
 12月1日から、(仮)姥ヶ懐トンネル工事のホームページを公開しています。アドレスは以下です。  
<http://ubagafutokoro-t.com/>  
 工事の進捗状況やTOPICSを掲載していますので、皆様にもみていただければ、幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	村田側 →
掘削工		810 m 完了	
インパート工		618m 完了	
防水工		500 m 完了	
覆工		470 m 完了	
舗装工			

掘削工は1日で4~5m(月進90m程度)、インパート工は、1週間で25m程(月進100m程度)、覆工は1週間で30m程(月進行115m程度)のペースで進んでいます。順調です！

〒989-2465  
 宮城県岩沼市志賀新四十刈1  
 安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体  
 姥ヶ懐トンネル作業所  
 TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998  
 フリーダイヤル 0120-034-755  
 作業所長 西川 篤哉
