

# (仮)姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No.9



ごあいさつ  
 志賀地区及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV、姥ヶ懐トンネル作業所長の西川です。暑い日が続いていますね！ 稲や畑の作物の成長には、もってこいでしょうが、人間にはちょっと辛いですね・・・。トンネルの中も灼熱地獄ですが、坑夫さんも熱中症にならないよう、こまめに水分補給をしながら元気に仕事をしています。今月も、工事の進捗状況についてご報告させていただきます。6月末時点で、『トンネル掘削』は岩沼側坑口から約885m（全長1,285m）、トンネルの下部（皆様が、車で走る道路の下の部分）にあたる『インパート工』も、現在704m完了。トンネルの最終仕上がりにあたる『覆工コンクリート工』は、現在565m完了しています。トンネルから発生した土砂は、変わらず名取地区まで運搬しています。志賀にお住まいの皆様にご迷惑にならないよう最大限の注意を払いながら、進めてまいります。今月は、工事の最盛期を迎え、続々と開催されている現場見学会の様子をお伝え致します。



トンネル坑内は、涼しいのでは？と皆さん思われるかもしれませんが、実は、高温多湿で、作業員さんにとっては過酷な環境なんです。こまめに水分を取らなければあっという間に熱中症になってしまいます。まさに危険と隣り合わせで仕事をしている状態です。そこで、現場では、各作業箇所に送風機や冷風器を置いて適宜休憩をとったり、緊急時に備えて、上左の写真のような熱中症対策キッドも常備し、万全な対策を施しています。その他、不測の事態に備えて、AED(上右)も置いてありますので、もしも・・・の際は、近隣及び通りがかりの皆さんも使っていただければ幸いです。

## トンネル現場見学会、今が旬です。続々と開催中！！

皆さん、暑期中ありがとうございました！  
 BY 西川

6/15 柴田町議会の皆様



この中から未来の土木技術者が生まれてくれるといいなあ！  
 がんばってね！！



6/22 柴田農林高校の皆様




6/26 仙台ダム事務所の皆様



切羽(起点坑口から885m)

## (仮)姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況 (H29.6.30)

トンネル工 L=1285.0m

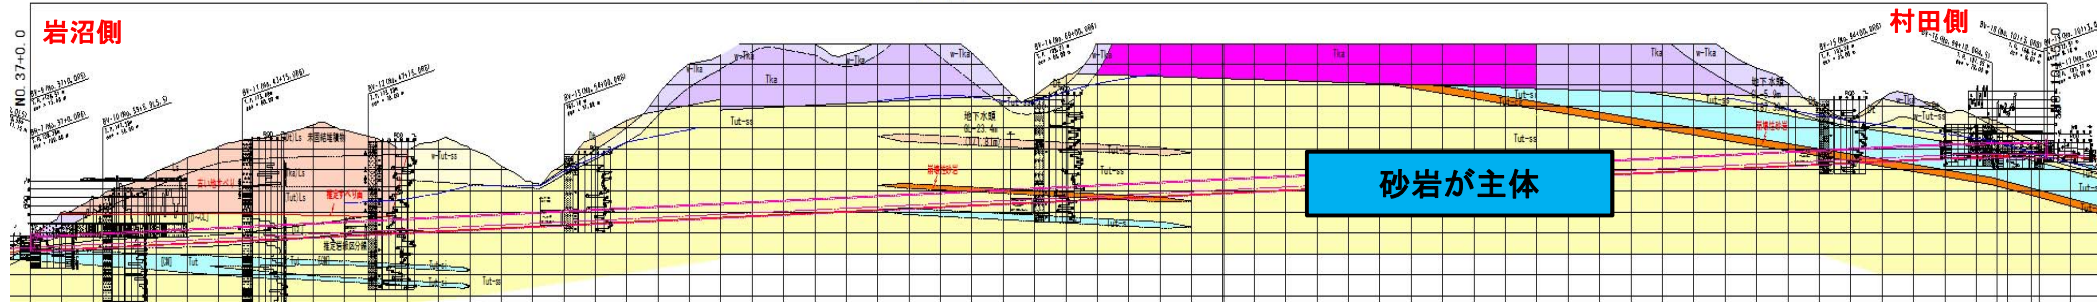

お知らせ  
 12月1日から、(仮)姥ヶ懐トンネル工事のホームページを公開しています。アドレスは以下です。  
<http://ubagafutokoro-t.com/>  
 工事の進捗状況やTOPICSを掲載していますので、皆様にも見ていただければ、幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	村田側 →
掘削工		885 m 完了	
インパート工		704m 完了	
防水工		600 m 完了	
覆工		565 m 完了	
舗装工			

掘削工は1日で4~5m(月進90m程度)、インパート工は、1週間で25m程(月進100m程度)、覆工は1週間で30m程(月進行115m程度)のペースで進んでいます。そろそろ先が見えてきました・・・。

〒989-2465  
 宮城県岩沼市志賀新四十刈1  
 安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体  
 姥ヶ懐トンネル作業所  
 TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998  
 フリーダイヤル 0120-034-755  
 作業所長 西川 篤哉
