

(仮) 姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No.10



ごあいさつ
 志賀地区及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV、姥ヶ懐トンネル作業所所長の西川です。最近、ちょっと涼しい日もありますが、これから暑さも益々本番を迎えます。道産子の私は、あまりの暑さに毎日驚いていた7月でした。トンネルの中は、直射日光こそないですが、暑さと湿気で、作業員さんもとても苦労しながら仕事をしています。今月も、工事の進捗状況についてご報告させていただきます。7月末時点で、『トンネル掘削』は岩沼側坑口から約975m(全長1,285m)、トンネルの下部(皆様が、車で走る道路の下の部分)にあたる『インパート工』も、現在790m完了。トンネルの最終仕上がりにあたる『覆工コンクリート工』は、現在679m完了しています。8/11~8/20、トンネル工事も夏休みに入ります。休み明け、再び、頑張っって進んでいきます。今月は、先月に引き続き、工事の最盛期を迎え、続々と開催されている現場見学会の様子をお伝え致します。



たくさんの方々に現場をみていただけて嬉しいです!

また来てね~!



トンネル現場見学会ラッシュ!!!

7/26 2市6町技術者見学会



7/27 岩沼市土木部見学会



7/31 村田小学校親子見学会




8/2 岩沼西小学校親子見学会



(仮) 姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況 (H29.7.31)

トンネル長 L=1285.0m

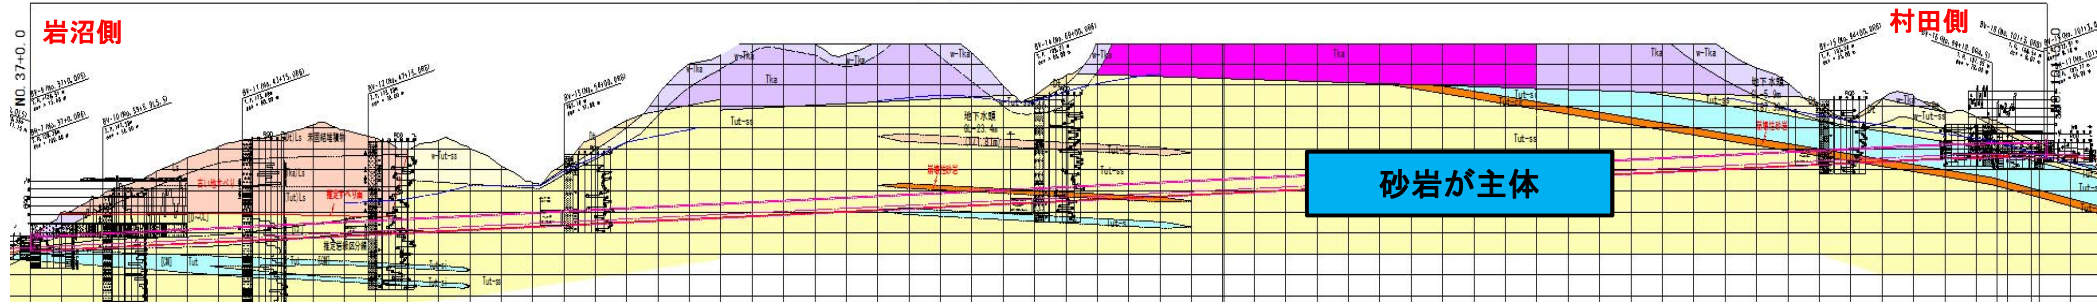

お知らせ

12月1日から、(仮)姥ヶ懐トンネル工事のホームページを公開しています。アドレスは以下です。
<http://ubagafutokoro-t.com/>
 工事の進捗状況やTOPICSを掲載していますので、皆様にも見ていただければ、幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	村田側 →
掘削工			974 m 完了
インパート工			790 m 完了
防水工			700 m 完了
覆工			679 m 完了
舗装工			

掘削工は1日で5m(月進90m程度)、インパート工は、1週間で25m(月進100m程度)、覆工は1週間で30m程(月進行115m程度)のペースで進んでいます。貫通見えて来ました。

〒989-2465
 宮城県岩沼市志賀新四十刈1
 安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体
 姥ヶ懐トンネル作業所
 TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998
 フリーダイヤル 0120-034-755
 作業所長 西川 篤哉
