

# (仮) 姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No.12



**ごあいさつ**

志賀地区及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV、姥ヶ懐トンネル作業所所長の西川です。あれほど暑かった夏が嘘のように寒くなってしまいました。身体もついていきませんね。風邪などに十分ご注意ください。トンネル工事の方は、9月、少しペースダウンしています。何故かと言いますと、トンネルに変状が発生し、掘り進めるのを一時的に休止して、その補強作業を行っていたからです。ですが、9月末にてその作業も無事に完了して、掘削作業を再開しております。問題なく完了しましたのでご安心ください。その影響で9/20に予定していた姥ヶ懐地区の皆様の見学会が延期となってしまった事をこの場をお借りしてお詫び致します。再度、機会を作らせていただきたいと思います。貫通側に当る終点坑口(村田側)の作業も、順調に進んでおり、法面工も間もなく完了して擁壁工・坑口盛土作業を行って行きます。(10月末完了予定)。そこが貫通点になります。岩沼蔵王線を走りながら見ていただければと思います。今月は、9月に行なった補強工や終点側の状況等をご紹介します。



貫通まで、あと200m!!

## 姥ヶ懐トンネルの現場状況

変状に対する補強(増しボルト工)



増しロックボルトを打設して、トンネルの補強を行なっています。赤いスプレーが通常のボルトで青いスプレーが増しボルトです。これで安心!

終点坑口(村田町側)



岩沼市クリーン作戦に参加しました!



9月9日に開催された岩沼市クリーン作戦に、現場メンバーで参加致しました。6月の時も思いましたが、本当に綺麗な街で、ゴミが少なかったという印象です。皆さんと記念写真を撮らせていただきました。

非常駐車帯の妻壁です。雰囲気出て来ましたね!




『農事組合法人 志賀』の皆様から、収穫したての『志賀米』をいただきました!! 早速、事務所メンバーでありがたく頂きました。農家の皆様の苦労と努力と心のたっぶりつまったご飯。とっても美味しかったです。ありがとうございました!!

トンネル掘削 ライブ中継 10/10から開始!!



## (仮) 姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況 (H29.9.30)

トンネル工 L=1285.0m

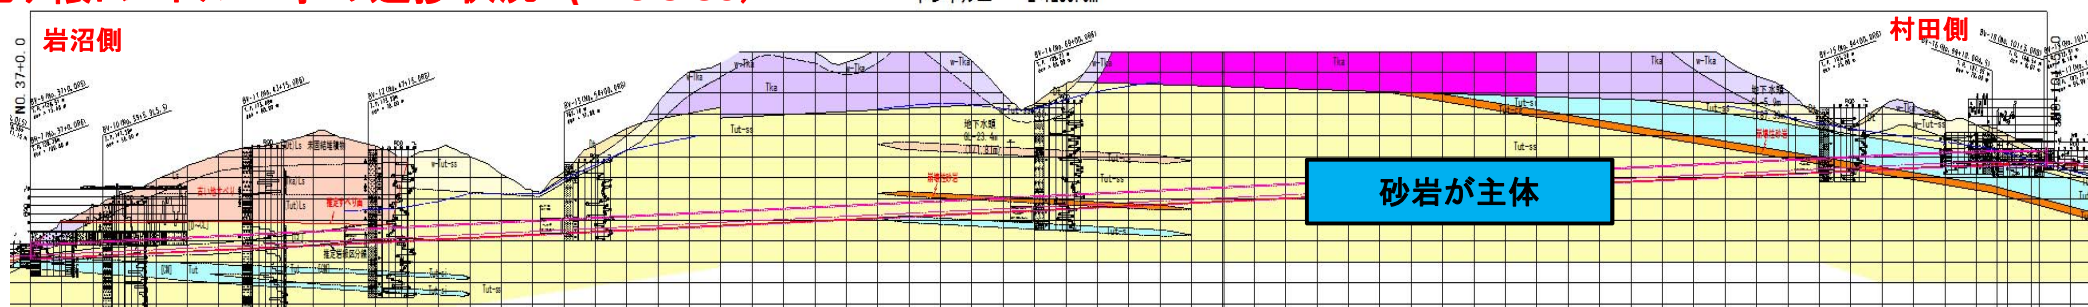

施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	村田側 →
掘削工		1080m 完了	
インパート工		916 m 完了	
防水工		800 m 完了	
覆工		730 m 完了	
舗装工			



残すところ200m程となりました。貫通は、12月上旬くらいの予定です!!

### お知らせ

当現場事務所の横に、小さなハウスを置きました。その中にモニターを置いて、トンネルの掘削状況のライブ中継を行ないます。尚、開放時間は、9:00 ~ 17:00 です。貫通まで200m。是非、トンネル工事の様子をご覧くださいと思います。姥ヶ懐トンネル工事のホームページも公開中です。合わせてご覧ください。

<http://ubagafutokoro-t.com/>



〒989-2465  
 宮城県岩沼市志賀新四十刈1  
 安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体  
 姥ヶ懐トンネル作業所  
 TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998  
 フリーダイヤル 0120-034-755  
 作業所長 西川 篤哉
