

# (仮) 姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No.13



**ごあいさつ**  
 志賀地区及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV、姥ヶ懐トンネル作業所所長の西川です。天候不順の影響もあってか、紅葉ももうひとつというところですが、秋も深まって参りました。これから冬まっしぐらといったところでしょう。雪こそ少ないんですが、寒さは厳しいかと思われます。風邪・インフルエンザなどには十分ご注意ください。トンネル工事の方は、10月はペースを取り戻し、残すところ100mというところまでたどり着きました。カウントダウンスタートです。そこで、岩沼側と村田側の工事現場出入口付近に電光表示盤を設置しました。今後、『貫通まで残り〇〇m』と表示し、リアルタイムに皆さんにお伝えしていきたいと思ひます。お通りの際に確認いただければと思ひます。そして、9/20に予定してました姥ヶ懐地区の皆様の見学会ですが、11/15に開催させていただきます！恐らく、残り70mくらいのタイミングかと。楽しみにしていただければと思ひます。今月も、工事の進捗状況について、ご紹介させていただきます。



貫通まで、あと100m!! もうひといき!!

## 姥ヶ懐トンネルの現場状況

### 現場見学会

#### 非常駐車帯セントル組立完了



このトンネルは、2箇所少し断面の大きな区間があり、非常駐車帯と呼ばれています。そのための型枠兼足場となるスライドセントルです。



#### 終点側(村田町)坑口現況



ここに貫通するんですよ！県道から見えますね！



#### 地盤工学会 東北支部の皆さん



#### 柴田町の皆さん



#### 電光表示盤(岩沼側)



#### 電光表示盤(村田側)



#### 中間技術検査(10/31)



宮城県検査官の方々による厳しい検査がありました。JVの皆さん、あぶら汗タラタラ...




#### トンネル掘削 ライブ中継 10/10から開始！！ インフォメーションセンター



## (仮) 姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況 (H29.10.31)


トンネル長 L=1285.0m

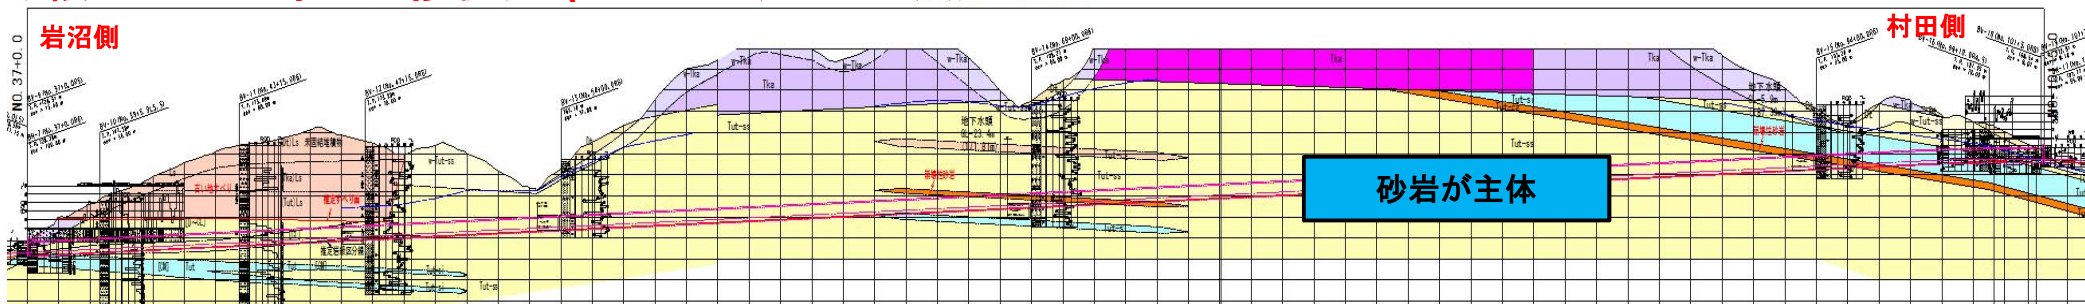

### お知らせ

当現場事務所の横に、トンネルの掘削状況のライブ中継を行なうインフォメーションセンターを設置しています。モニターで掘削最前線の様子を見ていただくことができます。又、トンネルから出てきた岩石も展示しております。開放時間は、平日9:00～17:00となっています。土曜日も事務所に顔を出していただければ開放致します。貫通まであと100m。是非、トンネル工事の様子をご覧いただければと思ひます。姥ヶ懐トンネル工事のホームページも公開中です。合わせてご覧ください。  
<http://ubagafutokoro-t.com/>

施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	村田側 →
掘削工			1172m 完了
インパート工			979m 完了
防水工		840 m 完了	
覆工		800 m 完了	
舗装工			



残すところ100mとなりました。貫通は、12月上旬頃の予定です!!

〒989-2465  
 宮城県岩沼市志賀新四十刈1  
 安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体  
 姥ヶ懐トンネル作業所  
 TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998  
 フリーダイヤル 0120-034-755  
 作業所長 西川 篤哉
