

(仮) 姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No. 14



ごあいさつ
 志賀地区及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV、姥ヶ懐トンネル作業所所長の西川です。空気も乾燥し寒さが日増しに厳しくなって来ました。冬突入ですね。風邪・インフルエンザ大流行の季節です。お部屋の湿度を上げて、うがいを徹底して予防に努めましょう。トンネル工事の方は、いよいよ貫通間近です。残すところ、あと5mとなり、いよいよ12月7日に貫通致します。昨年の6月4日に着工式・安全祈願際を行い、掘削がスタートしましたが、以来18ヶ月。変状の影響もあって少し予定よりも延びましたが、この瞬間を迎えることができます。県道25号線の村田側の終点坑口にぽっかりと直径1mくらいの穴が開きます。お通りの際は、眺めていただければと思います。恐らく、12月10日くらいまでには、完全に切り開かれる予定です。実貫通の様子は、号外にてまたご案内させていただくとして、今回は、11/15に開催いたしました姥ヶ懐地区の皆様との現場見学会の様子や事務所前に設置したイルミネーションの様子等について、ご紹介させていただきます。



貫通まで、あとひといき！！

姥ヶ懐トンネルの現場状況

11/15 姥ヶ懐地区住民見学会



JV事務所の前に、イルミネーションを設置しました。今年は、ちょっと力を入れてみました。担当したのは、今年配属された女子新入社員の中川です。男子よりセンスいいかな？



『志賀姥ヶ懐トンネルイルミネーション』、見に来てください！



姥ヶ懐地区の皆様には、9月に一度中止になってしまい、申し訳ありませんでした。そして大変お待たせしました。

30名もの方々に来ていただけて、嬉しいです。貫通、楽しみにしててください！




農事法人組合『志賀』の皆さんの豆の収穫前の草刈に参加しました。想像していたよりもハードワークで、農家さんの大変さが身に染みました。身体ぼろぼろです。(BY西川)



(仮) 姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況 (H29.11.30)

トンネル工 L=1285.0m

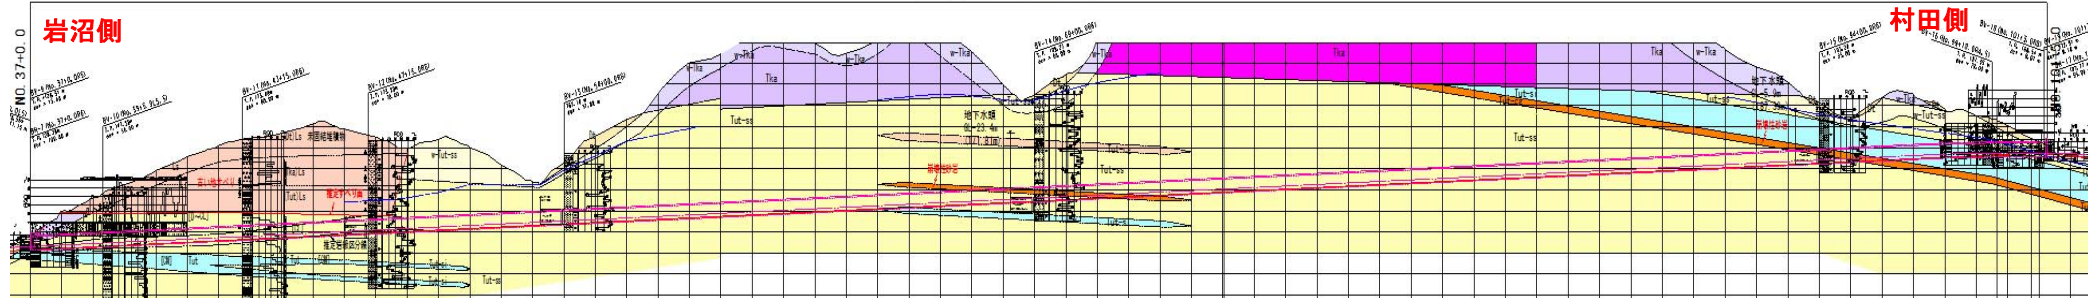

お知らせ

当現場事務所の横に、トンネルの掘削状況のライブ中継を行なうインフォメーションセンターを設置し、掘削最前線の様子をモニタリングしていましたが、貫通に伴い、12月中には撤収することになります。

姥ヶ懐トンネル工事のホームページは、引き続き公開中です。

<http://ubagafutokoro-t.com/>

施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	村田側 →
掘削工	1280m 完了		
インバート工	1080m 完了		
防水工	940m 完了		
覆工	900m 完了		
舗装工			

貫通しても、インバートと覆工はまだ続きます！もう少しお付き合いください。



〒989-2465
 宮城県岩沼市志賀新四十刈1
 安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体
 姥ヶ懐トンネル作業所
 TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998
 フリーダイヤル 0120-034-755
 作業所長 西川 篤哉
