

志賀姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No.16



安全は全てに優先する！！

志賀及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV、姥ヶ懐トンネル作業所長の西川です。やっと春になりました。とても暖かい日が続き、桜の開花も早そうですね。恐らく、これから絶好の花見シーズンとなることでしょう。飲み過ぎないように十分お気をつけください。
トンネル工事は、平成30年3月30日までの工期でしたが、この度延長となりました。恐らく、夏くらいまではここでのお世話になる事になるでしょう。残りもあとわずかですが、もう少しお付き合いください。どうぞよろしくお願い致します。工事の進捗状況についてご報告致します。昨年の12月7日にトンネルが貫通後、3月12日に、道路の下部にあたるインバート工も完了しました。このインバート工は、後に水道管を通すためのさや管（直径1mのヒューム管）を設置するという、過去に例のない設計で、この工事の最大の懸案事項でしたが、創意工夫の末、無事に完了させる事ができました。（No.11掲載）続いて、中央排水工、防水工も完了し、覆工コンクリートも残すところ、後、70mというところまでできております。そんな中、2月下旬より、実際に車が走る道路部分にあたる舗装工が始まっています。現在は、道路脇に設置する排水工を進めています。今まで活躍してきた大きな機械や設備もなくなってきてトンネル坑内も少し寂しくなってきましたが、現在も40名ほどの作業員の皆さんによって日々工事が進められております。あともう一息。何としても事故なく完了させるようベストを尽くします。引き続き工事にご理解、御協力のほど、よろしくお願い致します。今月は、現在のトンネル坑内の様子などを写真を交えてご紹介したいと思います。

岩沼側坑口全景



村田側坑口
インバート最終ブロック施工状況



村田側坑口
インバート棧橋解体状況



村田側坑口全景



村田側坑口 県道より



トンネル坑内 終点(村田)側 状況



3月中旬頃の、村田側坑口付近の写真です。今ではもう防水シートが貼られていて、覆工コンクリートの施工を待つばかり。

トンネル坑内 起点(岩沼)側 状況




円形水路という既製品を並べて、水路を作っていきます。この間が道路になります。

覆工コンクリートも残すところ80m。ゴールデンウィーク明けくらいには完了です！！

志賀姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況 (H30. 3.31)

トンネル工 L=1285.0m

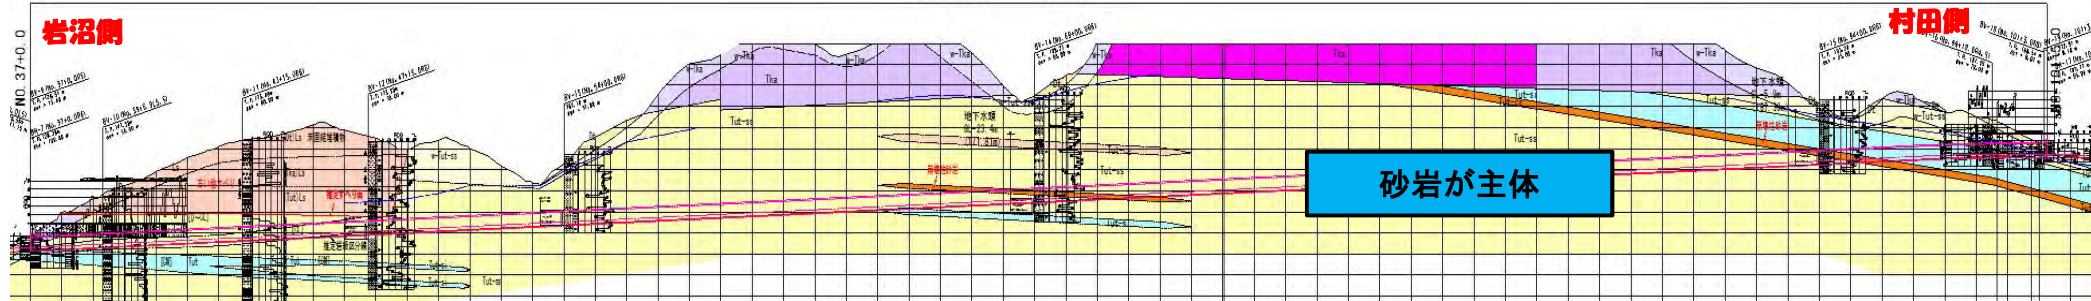

事務所前のイルミネーション、見ていただけていますか？事務所を解体するまで、点灯させておくつもりです。残り4ヶ月くらいですので、しっかり見ておいてくださいわ！



施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	村田側 →
掘削工			完了！！
インバート工			完了！！
防水工			完了！！
覆工		1200 m 完	
舗装工			

〒989-2465
宮城県岩沼市志賀新四十刈1
安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体
姥ヶ懐トンネル作業所
TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998
<http://ubagafutokoro-t.com/>
フリーダイヤル 0120-034-755
作業所長 西川 篤哉
