

# 志賀姥ヶ懐トンネル便り

安藤ハザマ・橋本店・上の組 JV

No.18



志賀及び姥ヶ懐地区にお住まいの皆様、安藤ハザマ・橋本店・上の組JV姥ヶ懐トンネル作業所長の西川です。またしてもご無沙汰をしてしまいました。申し訳ありません。工事も終盤戦、日々作業調整にエネルギーを使いすぎて・・・と、言い訳です。お許しください。それにしても毎日暑いですね！ 昨年よりも雨が少ないのが救いかと思いますが、暑さは例年以上のような気がします。生粋の道産子の私にとっては信じられない暑さです。その一方で、稲はすすくと成長しているのでしょうか。収穫の秋、楽しみです！

トンネル工事の工期も、残すところあと1ヶ月。9月末にて完了です。ですから、次の新聞が、恐らく最後になると思います。トンネル坑内の舗装コンクリートは、お盆前に無事に打設が完了しました。現在、縁石・監査路の施工を行なっています。後は、細かな排水工事、落石防護柵工事、盛土工事等。ほんともうすぐ終わってしまいます。平成28年の2月から工事が始まって、31ヶ月。正直な気持ちを言えば、寂しい気持ちでいっぱいですが、終わらせなければ・・・。無事故で完了させるよう最後の最後までベストを尽くします。今日は、現在施工中の舗装工事の様子を写真を交えてご紹介したいと思います。



安全は全てに優先する！！

舗装コンクリート打設前

スリップフォーム : コマンダーⅢ

舗装コンクリート打設状況

舗装コンクリート打設完了

舗装コンクリート打設前

スリップフォームという機械を使って施工します。

舗装コンクリート打設状況です。狭い中、村田側から岩沼側に打ち進めていきます。


舗装コンクリート完了です。この後は、監査路を施工して、トンネル工事は終了です。が、開通するまでには、電気工事や防災工事を行わなければなりません。それは、又、別の工事になります。なので、開通まで、もう少しかかると思います。

ベルトコンベアでコンクリートを受け取ります。

岩沼側坑口

## 志賀姥ヶ懐トンネル工事の進捗状況 (H30. 8.20)

トンネル長 L=1285.0m

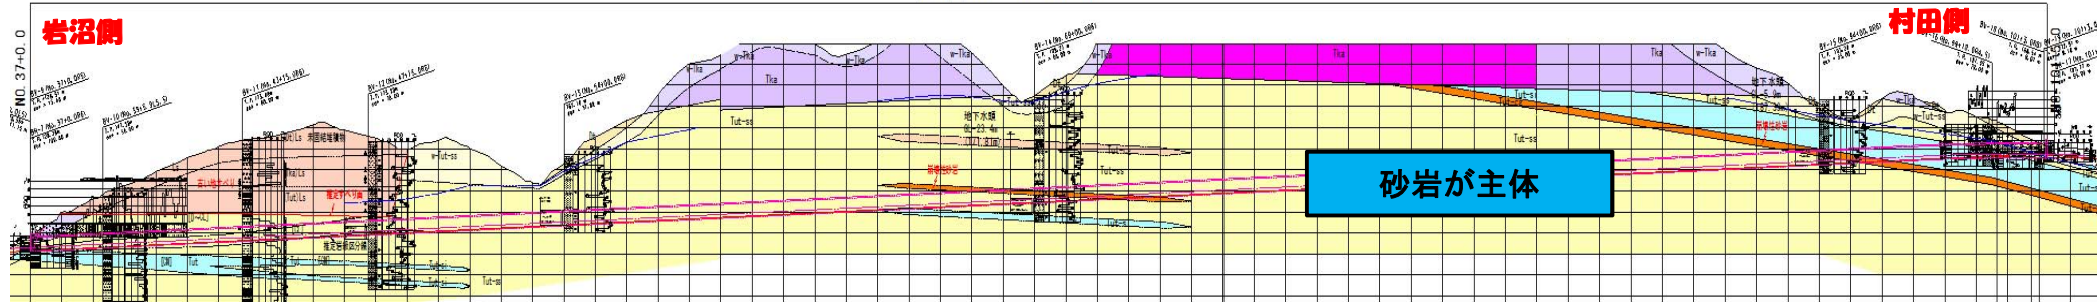

トンネルの村田側坑口の橋の工事も少しずつ進んでいます。ヤードが狭くて、日々、四苦八苦しています。来年春の完成目指して頑張ります！



施工延長	← 岩沼側	延長 1,285 m	村田側 →
掘削工			完了！！
インパート工			完了！！
防水工			完了！！
覆工			完了！！
舗装工			ほぼ完了！！

〒989-2465  
 宮城県岩沼市志賀新四十刈1  
 安藤ハザマ・橋本店・上の組 特定建設工事共同企業体  
 姥ヶ懐トンネル作業所  
 TEL 0223-25-4755 FAX 0223-23-3998  
<http://ubagafutokoro-t.com/>  
 フリーダイヤル 0120-034-755  
 作業所長 西川 篤哉
